




Diös

# INFORMATION OM HOTELLBYGGNATIONEN I CENTRALA SUNDSVALL

## BILDER PÅ DET BLIVANDE HOTELLET

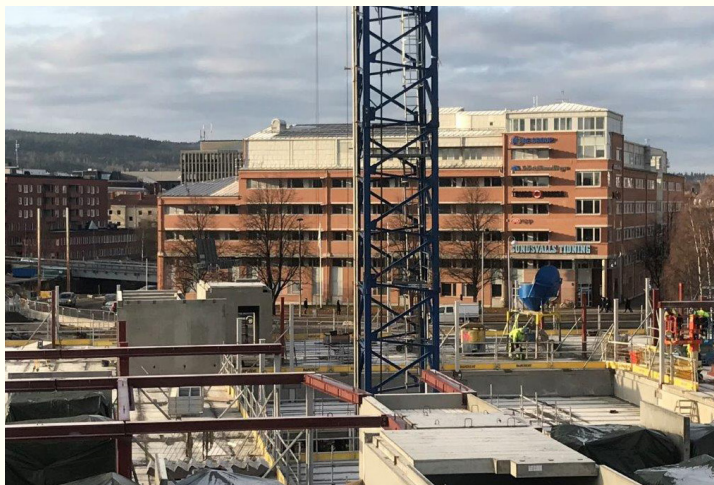

### STATUS JUST NU - FRÅN OCH MED V. 46

November är här och med det mörkare tider. Vi hoppas ni tar väl hand om er med mycket vitaminer, härligt umgänge och tända ljus.

På hotellbyggeriets platsen fortsätter tempot i samma fart som tidigare. Vi har precis slutfört arbetet med dagvatten och dränering. Hälften av alla badrumsmoduler på plan två är monterade och resterande kommer att levereras under nästa vecka. I källaren murar vi väggar och har påbörjat montage av ytterväggar i markplan. V. 47 kommer vi att montera utfackningsväggar på plan två.

På fredag 15/11 har vi bjudit in media till byggområdet så håll utkik efter ett större reportage med mycket insyn och spännande intervjuer.

### SNABBFAKTA

Rum: 270 st  
Storlek: 14 350 kvm  
Tillträde: 2021  
Byggherre: Diös  
Entreprenör: Serneke  
Arkitekt: Krook & Tjäder

### TIDPLAN

Fullständig tidplan hittar du på [dios.se](http://dios.se)  
April - juni: pålning och spontring  
Maj - september: grundläggning  
September 2019 - februari 2020: stomme  
Mars - april 2020: tak  
Q2 2021: planerad slutbesiktning

### TIPS!

Följ oss i sociala medier för att få de senaste nyheterna och inspirationen. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram.

### KONTAKT

Sofie Stark, affärschef, Diös  
Telefon: 010-470 96 50  
E-post: [sofie.stark@dios.se](mailto:sofie.stark@dios.se)

Ola Novén, projektutvecklare, Diös  
Telefon: 010-470 95 16  
E-post: [ola.noven@dios.se](mailto:ola.noven@dios.se)
